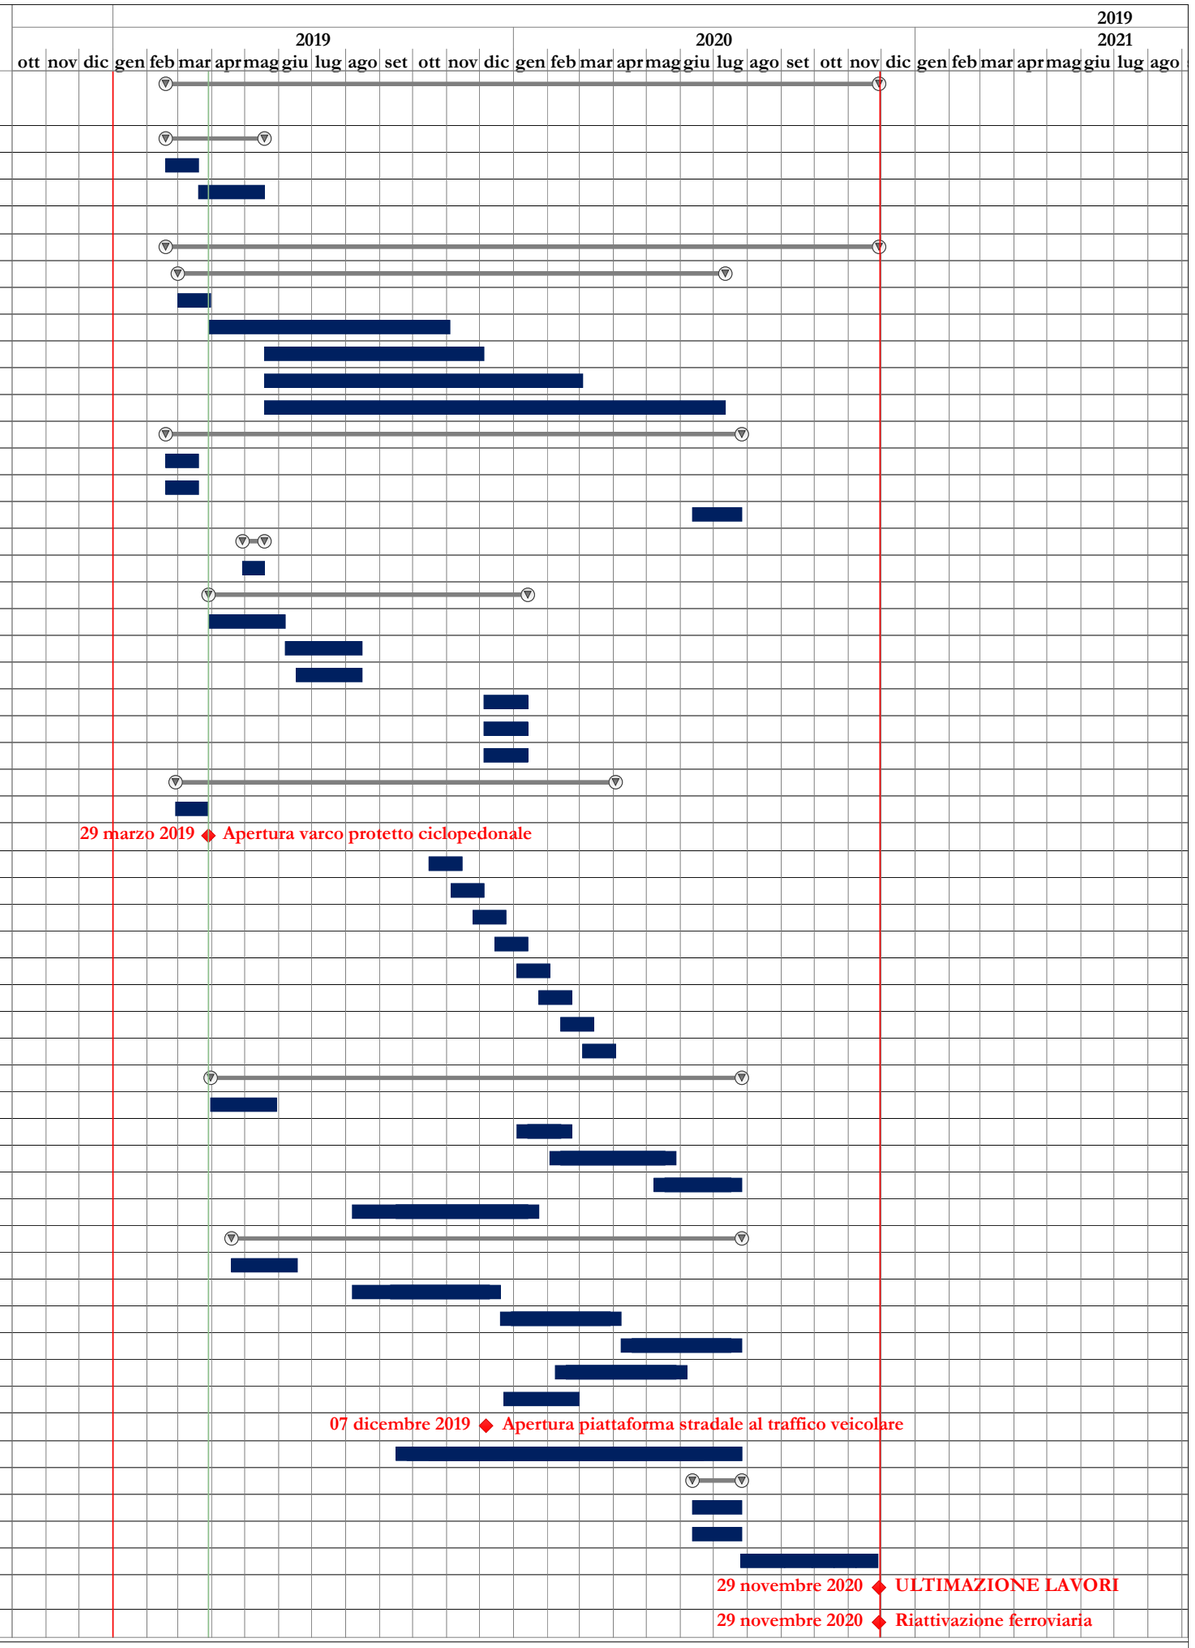Nome attività	Durata	Inizio	Fine
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SAN MICHELE A PADERNO D'ADDA	**650 g**	**18 febbraio 2019**	**29 novembre 2020**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	**90 g**	**18 febbraio 2019**	**19 maggio 2019**
Redazione progettazione esecutiva	**30 g**	**18 febbraio 2019**	**20 marzo 2019**
Approvazione progetto esecutivo e redazione progetto di dettaglio	**60 g**	**20 marzo 2019**	**19 maggio 2019**
Completamento consegna lavori appalto principale restauro travate, arco e pile	**0 g**	**19 maggio 2019**	**19 maggio 2019**
LAVORI	**650 g**	**18 febbraio 2019**	**29 novembre 2020**
CANTIERIZZAZIONE	**499 g**	**01 marzo 2019**	**12 luglio 2020**
Cantiere piattaforma stradale (riveniente da precedente appalto)	*30 g*	*01 marzo 2019*	*31 marzo 2019*
Cantiere piattaforma stradale (aperta a pedoni e cicli)	220 g	29 marzo 2019	04 novembre 2019
Cantiere piattaforma ferroviaria (travata)	200 g	19 maggio 2019	05 dicembre 2019
Cantiere su fondazioni arco e pile	290 g	19 maggio 2019	04 marzo 2020
Nuove piste di cantiere (incluso ripiego e sistemazione)	420 g	19 maggio 2019	12 luglio 2020
RILIEVI E INDAGINI INTEGRATIVE	**525 g**	**18 febbraio 2019**	**27 luglio 2020**
Realizzazione dei rilievi topografici delle sponde	30 g	18 febbraio 2019	20 marzo 2019
Indagini Geognostiche integrative	30 g	18 febbraio 2019	20 marzo 2019
Monitoraggio integrativo	45 g	12 giugno 2020	27 luglio 2020
BONIFICA BELLICA	**20 g**	**29 aprile 2019**	**19 maggio 2019**
BOE piste di cantiere e aree di cantiere	20 g	29 aprile 2019	19 maggio 2019
RIFACIMENTO PIATTAFORMA STRADALE	**291 g**	**29 marzo 2019**	**14 gennaio 2020**
Rinforzo o sostituzione mensole ammalorate (completamento da precedente appalto)	70 g	29 marzo 2019	07 giugno 2019
Posa pietre marciapiedi e scarichi acque (completamento)	70 g	07 giugno 2019	16 agosto 2019
Restauro parapetto e posa barriera	60 g	17 giugno 2019	16 agosto 2019
Giunti d'impalcato e pavimentazione in conglomerato bituminoso	40 g	05 dicembre 2019	14 gennaio 2020
Posa barriera stradale	40 g	05 dicembre 2019	14 gennaio 2020
Posa segnaletica	40 g	05 dicembre 2019	14 gennaio 2020
RESTAURO E RINFORZO TRAVATA	**401 g**	**27 febbraio 2019**	**03 aprile 2020**
Fase propedeutica interventi aste per apertura ciclopedonale (avviata su precedente appalto)	*30 g*	*27 febbraio 2019*	*29 marzo 2019*
Apertura varco protetto ciclopedonale	**0 g**	**29 marzo 2019**	**29 marzo 2019**
Trave 1	**30 g**	**16 ottobre 2019**	**15 novembre 2019**
Trave 2	**30 g**	**05 novembre 2019**	**05 dicembre 2019**
Trave 3	**30 g**	**25 novembre 2019**	**25 dicembre 2019**
Trave 4	**30 g**	**15 dicembre 2019**	**14 gennaio 2020**
Trave 5	**30 g**	**04 gennaio 2020**	**03 febbraio 2020**
Trave 6	**30 g**	**24 gennaio 2020**	**23 febbraio 2020**
Trave 7	**30 g**	**13 febbraio 2020**	**14 marzo 2020**
Trave 8	**30 g**	**04 marzo 2020**	**03 aprile 2020**
RESTAURO E RINFORZO PILE	**484 g**	**31 marzo 2019**	**27 luglio 2020**
Fase propedeutica interventi	**60 g**	**31 marzo 2019**	**30 maggio 2019**
Pila 7	**50 g**	**04 gennaio 2020**	**23 febbraio 2020**
Pile 2 - 5	**115 g**	**03 febbraio 2020**	**28 maggio 2020**
Pile 3 - 4	**80 g**	**08 maggio 2020**	**27 luglio 2020**
Pila 1 - 6	**170 g**	**07 agosto 2019**	**24 gennaio 2020**
RESTAURO E RINFORZO ARCO	**465 g**	**19 aprile 2019**	**27 luglio 2020**
Fase propedeutica interventi	**60 g**	**19 aprile 2019**	**18 giugno 2019**
Tratto tra pile 1 e 2	**135 g**	**07 agosto 2019**	**20 dicembre 2019**
Tratto tra pile 2 e 3	**110 g**	**20 dicembre 2019**	**08 aprile 2020**
Tratto tra pile 3 e 4	**110 g**	**08 aprile 2020**	**27 luglio 2020**
Tratto tra pile 4 e 5	**120 g**	**08 febbraio 2020**	**07 giugno 2020**
Tratto tra pile 5 e 6	**69 g**	**23 dicembre 2019**	**29 febbraio 2020**
Apertura piattaforma stradale al traffico veicolare	**0 g**	**07 dicembre 2019**	**07 dicembre 2019**
NUOVE ACCESSIBILITA' E LINEE VITA	**315 g**	**16 settembre 2019**	**27 luglio 2020**
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	**45 g**	**12 giugno 2020**	**27 luglio 2020**
Sistemazione piste di cantiere	45 g	12 giugno 2020	27 luglio 2020
Rinverdimento piazzole e scarpate	45 g	12 giugno 2020	27 luglio 2020
COLLAUDI TECNICI PER RIATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE FERROVIARIA	**126 g**	**26 luglio 2020**	**29 novembre 2020**
ULTIMAZIONE LAVORI	**0 g**	**29 novembre 2020**	**29 novembre 2020**
Riattivazione ferroviaria	**0 g**	**29 novembre 2020**	**29 novembre 2020**
